

Ausschuss für Mobilität, Bauen und Geoinformation


Sachstand zum Straßen- und Radwegebau

K42, Rhynerner Straße, Bönen

- beschädigte Leitpfosten
- ausgefahrenes Bankett
- Errichtung einer EDSP (Leitplanke)




K16, Rotherbachstr., Bergkamen

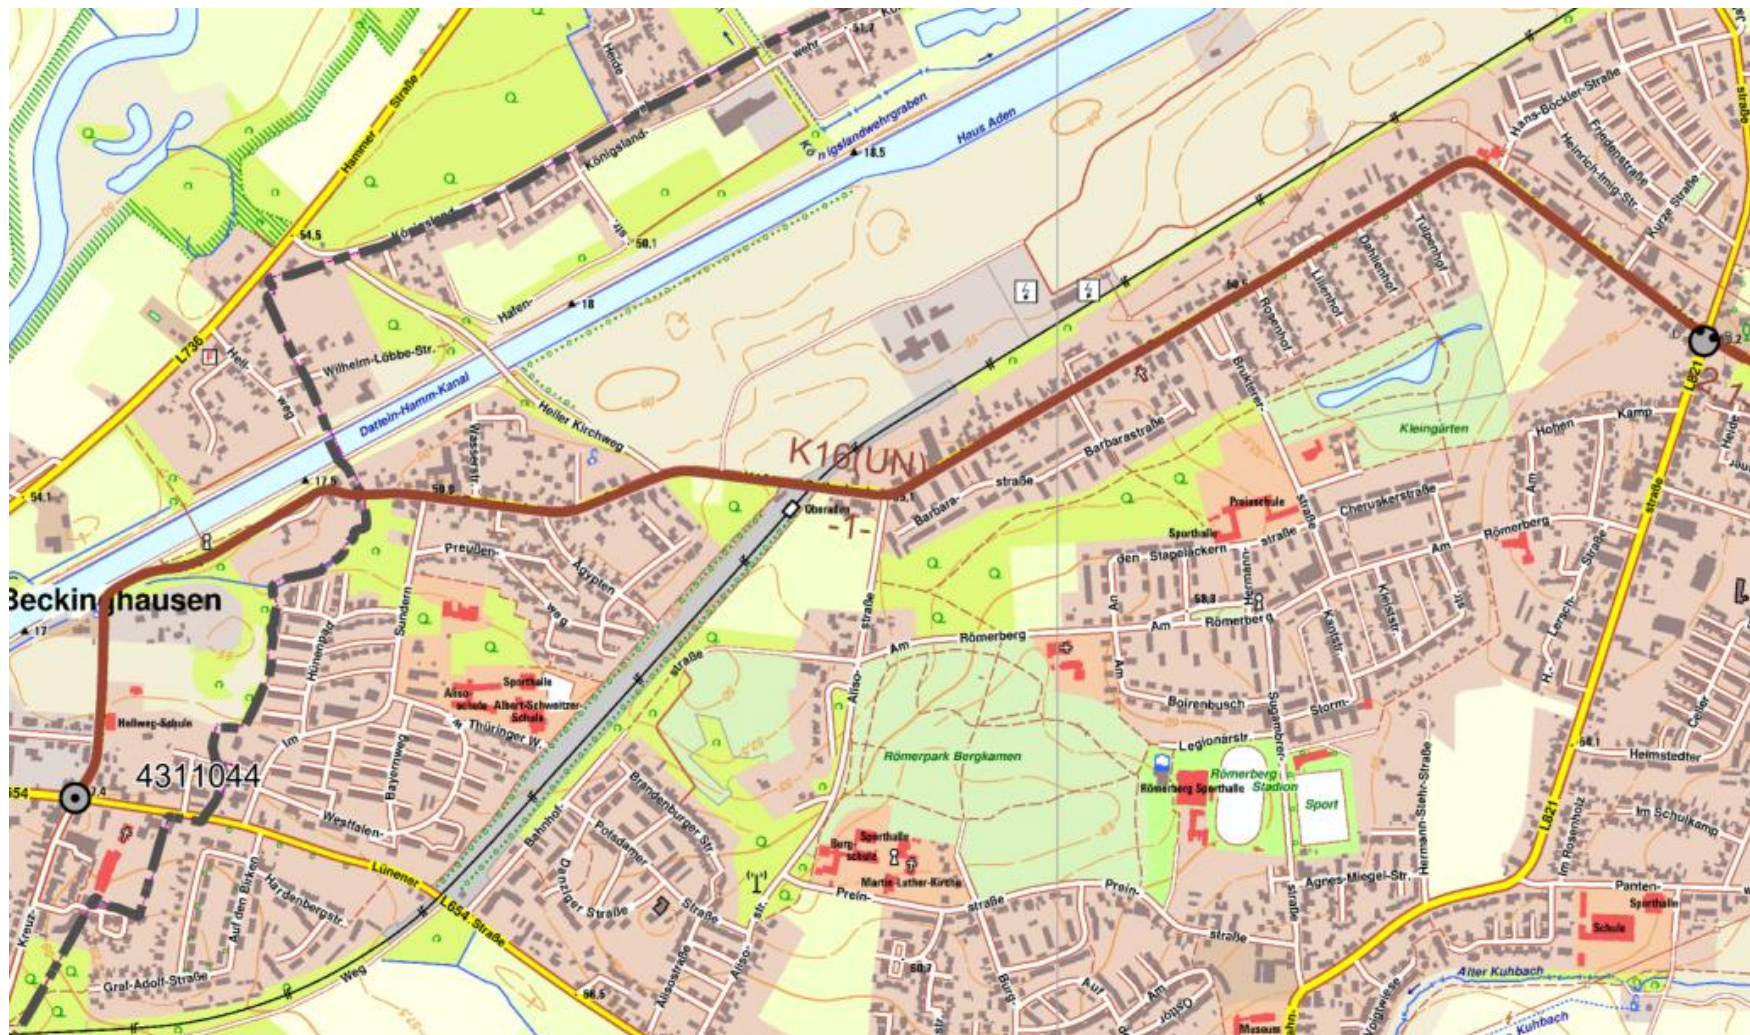

K16, Rotherbachstr., Bergkamen

- Erneuerung der Asphaltbinder-, und Deckschicht
- Baubeginn nach Fertigstellung der Sanierung der Landesstraße L654 und Wasserleitung Anfang 2023 (ursprünglich Herbst 2022)
- Bauzeit 2 Monate


K9, Weddinghofer-/Bergkamener Str., Kamen

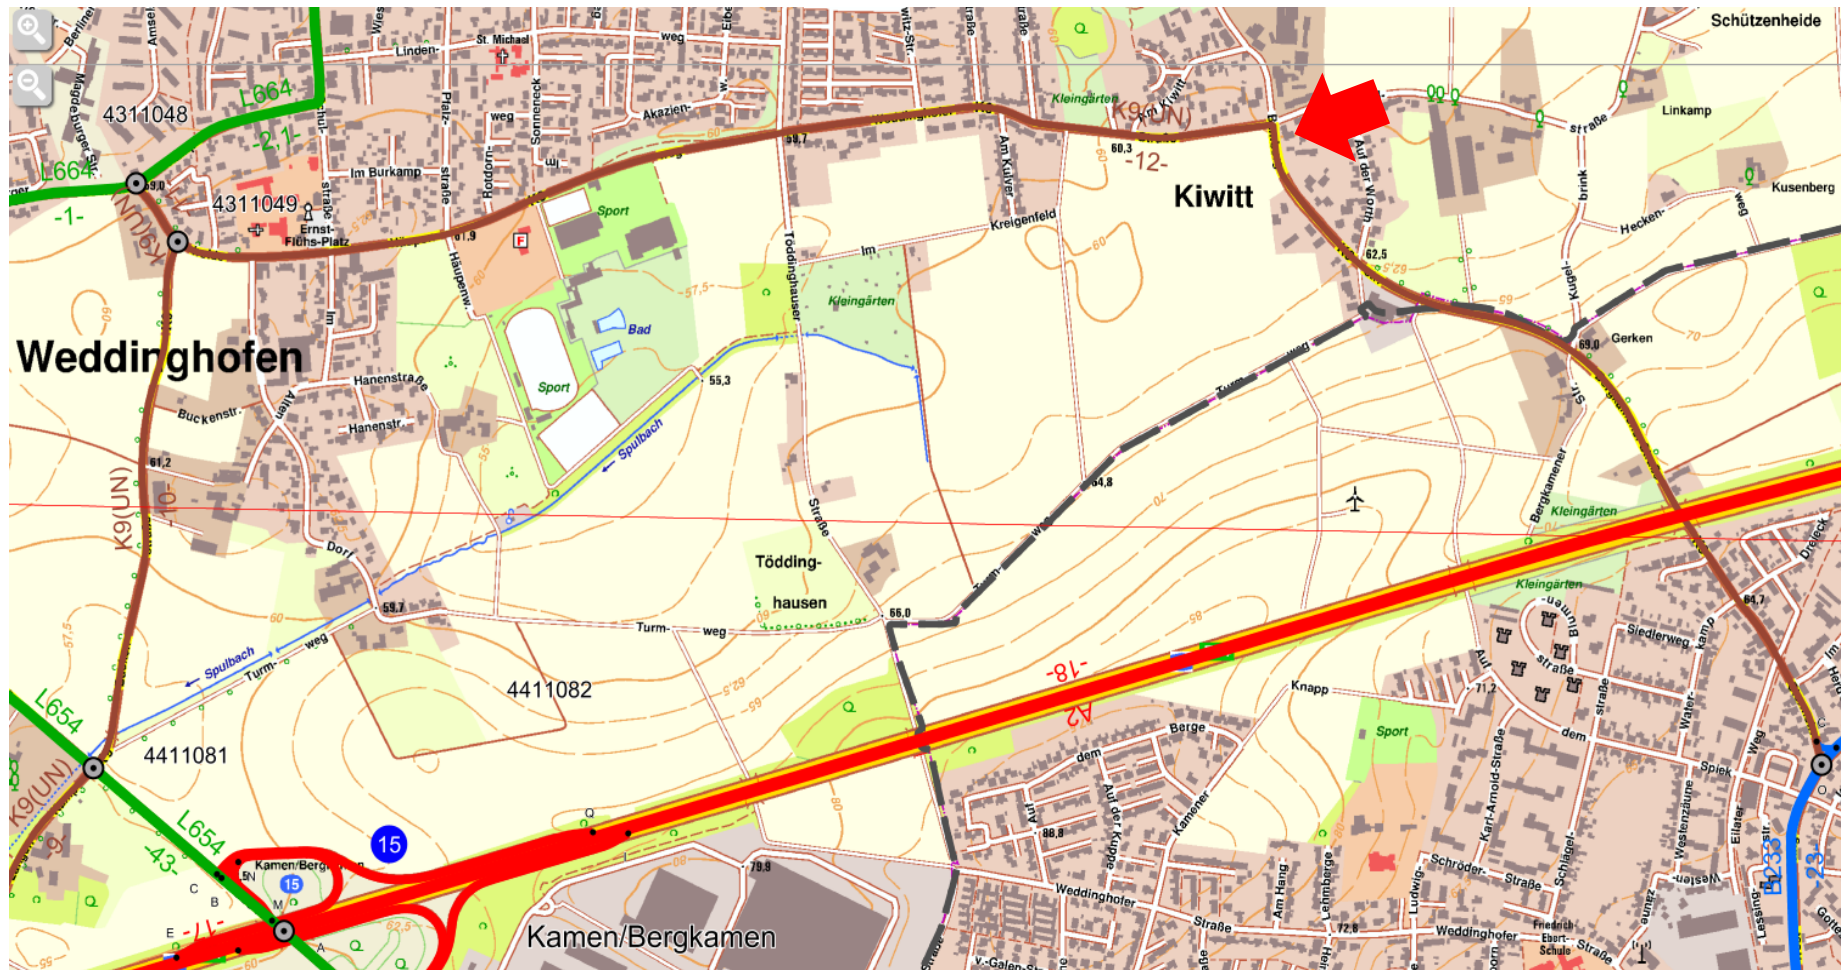

K9, Weddinghofer-/Bergkamener Str., Kamen

- Erneuerung der Asphalttrag-, und Deckschicht
- Baumaßnahme fertiggestellt
- Nachbesserungsarbeiten der Radwegführung im Bereich der Bambergstraße Kreuzung Weddinghofer Straße im Jahr 2023


K4, Mühlenstraße, Radwegbau, Werne

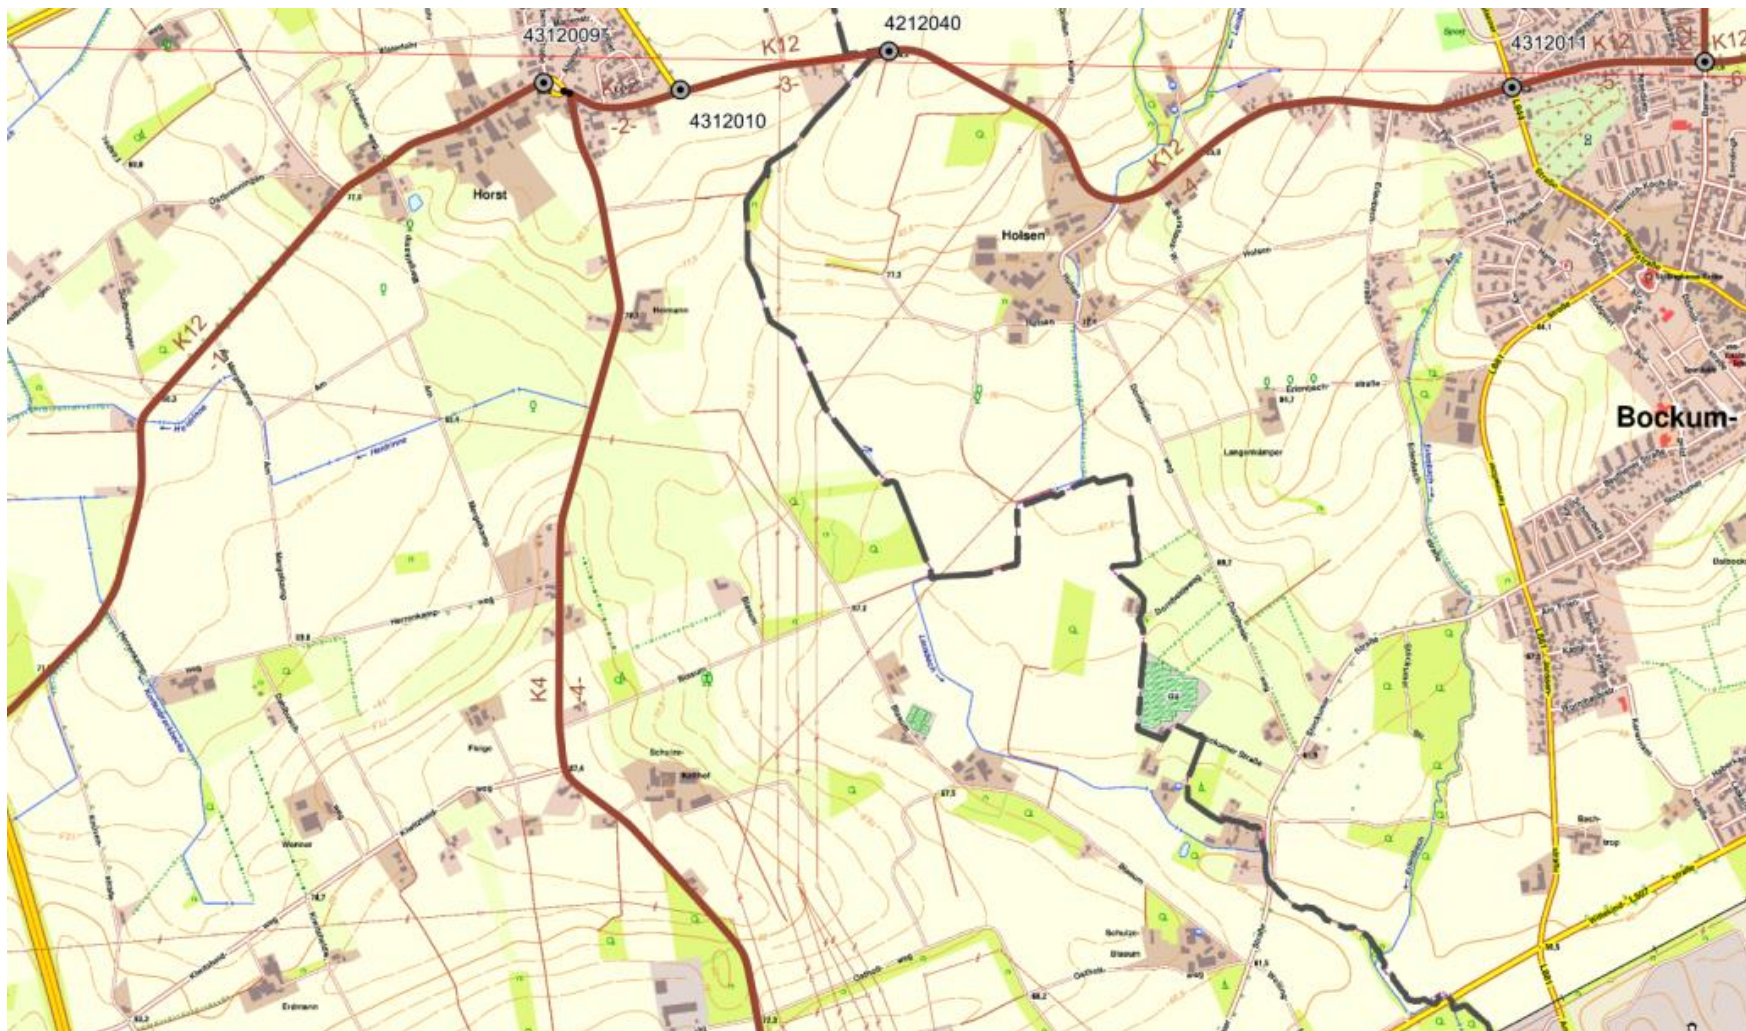

K4, Mühlenstraße, Radwegbau, Werne

- Radwegbau und Deckensanierung
- Baubeginn November 2021, Fertigstellung Anfang 2023, (ursprünglich Oktober/ Ende September 2022)
- Baustelle personell unterbesetzt
- Mehrarbeit aufgrund tiefergehender Schäden im Asphaltaufbau
- Radweg fertiggestellt

K41, Mühlenstraße, Kamen

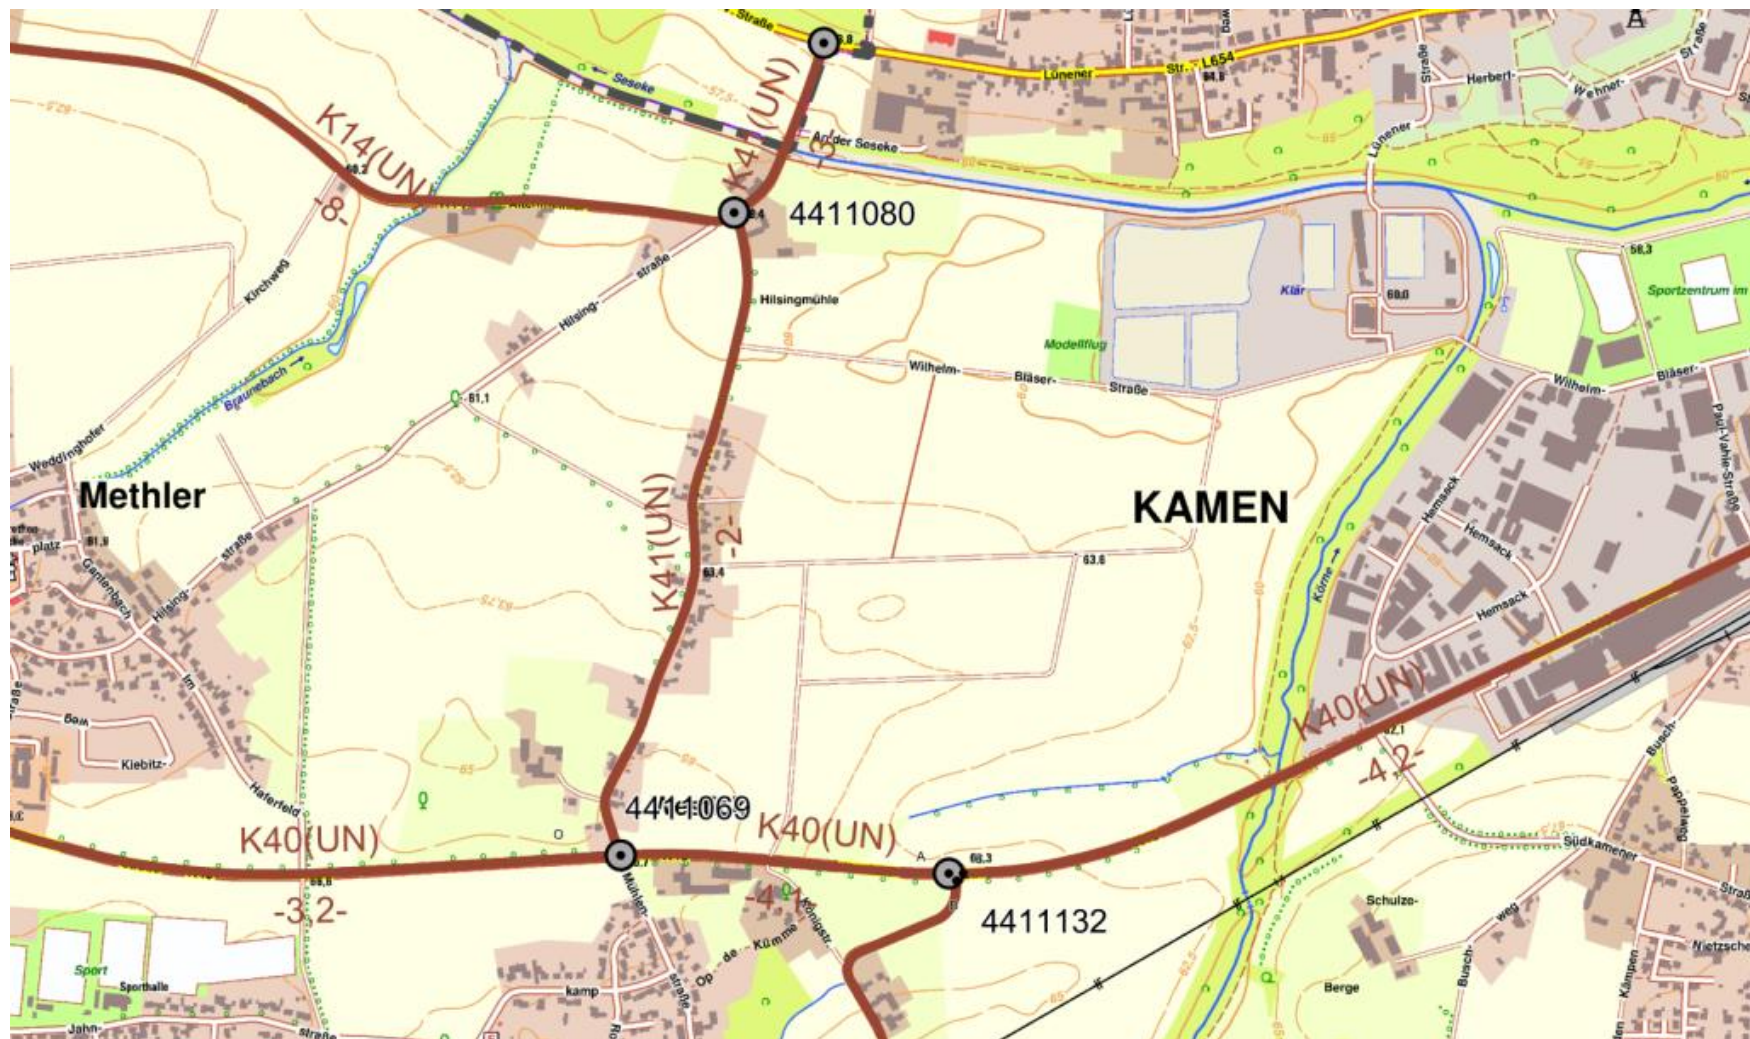

K41, Mühlenstraße, Kamen

- Erneuerung der Asphalttrag- und Asphaltdeckschicht
- Baumaßnahme fertiggestellt
- Abnahme erfolgt

Neubau K40n, Südkamener Spange




Neubau K40n, Südkamener Spange



Neubau K40n, Südkamener Spange

- KVP an der L663 bis auf Restarbeiten fertiggestellt
- Anschluss an die Dortmunder Allee erfolgt noch im Dezember
- Lärmschutzwall teilweise fertiggestellt
- Aushubarbeiten im östlichen Bereich des Trogbauwerks
- Maßnahme verläuft weiterhin planmäßig


K38, Bruchstraße Brücke Mühlbach, Unna

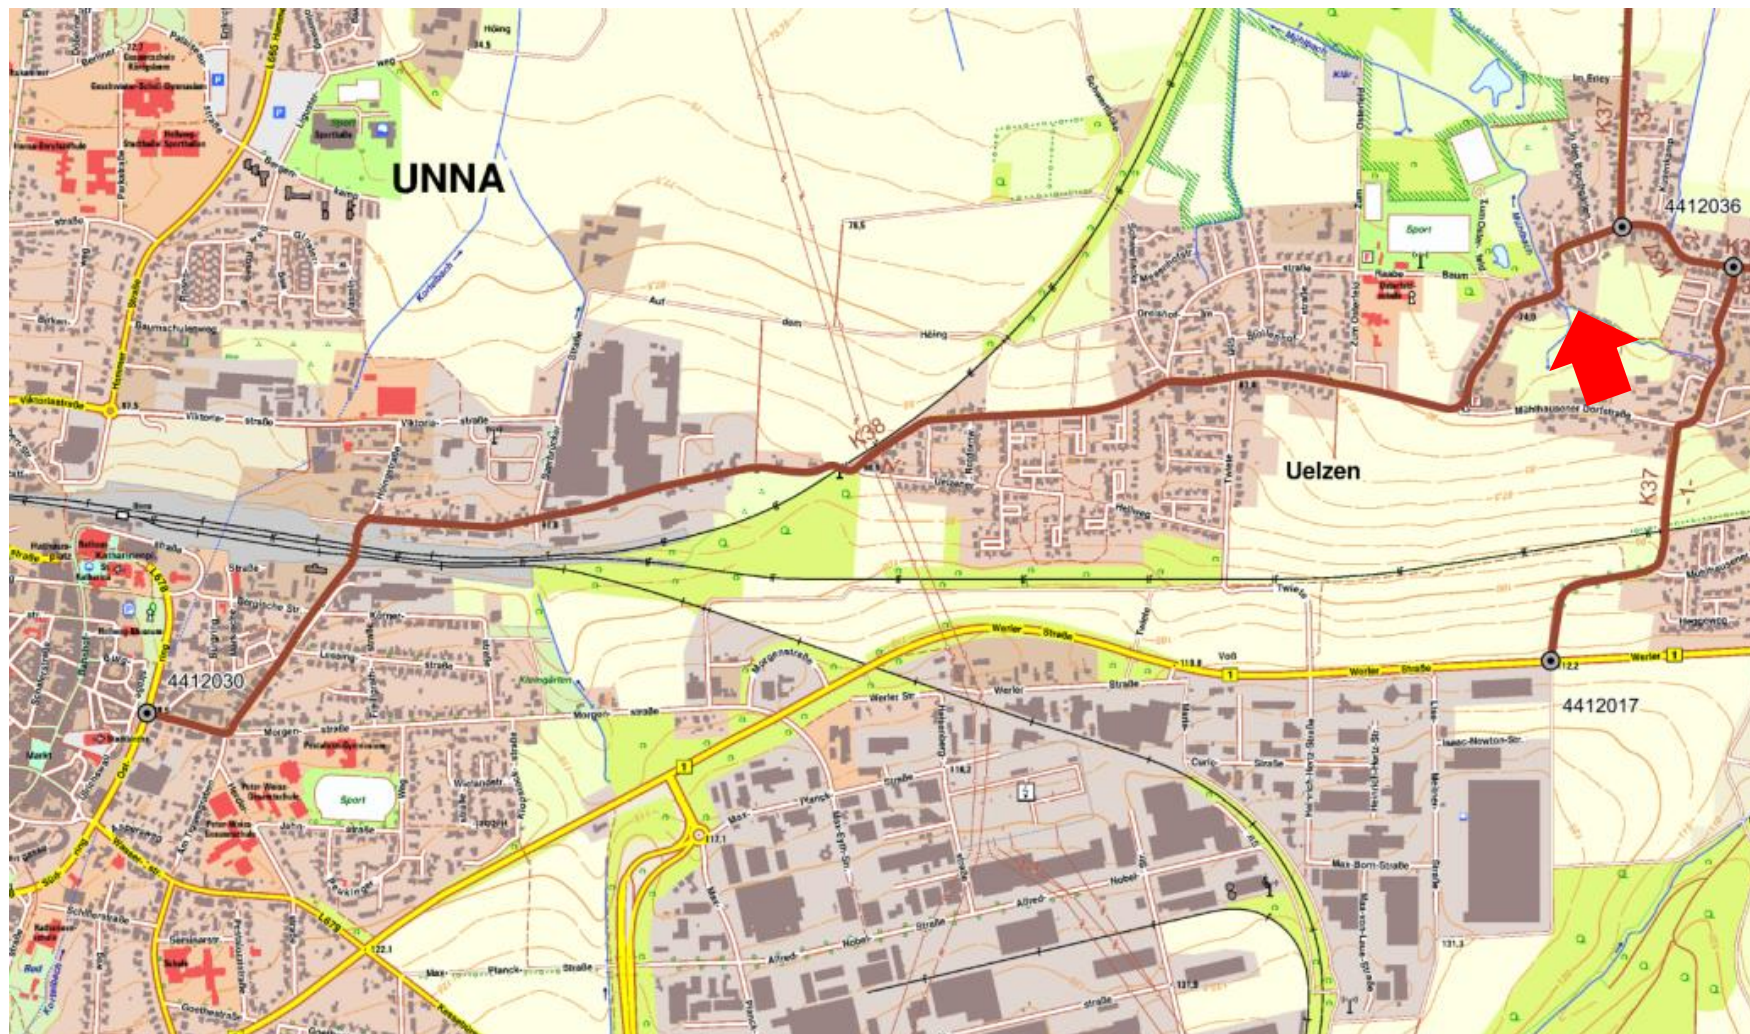

K38, Bruchstraße Brücke Mühlbach, Unna

- Neubau Brücke über den Mühlbach
- Baustart September
- Fertigstellung Frühling 2023
- U-Strecke über die Mühlhausener Dorfstraße
- Brückenabriss erfolgte störungsfrei


K11, Borker Straße, Selm-Cappenberg

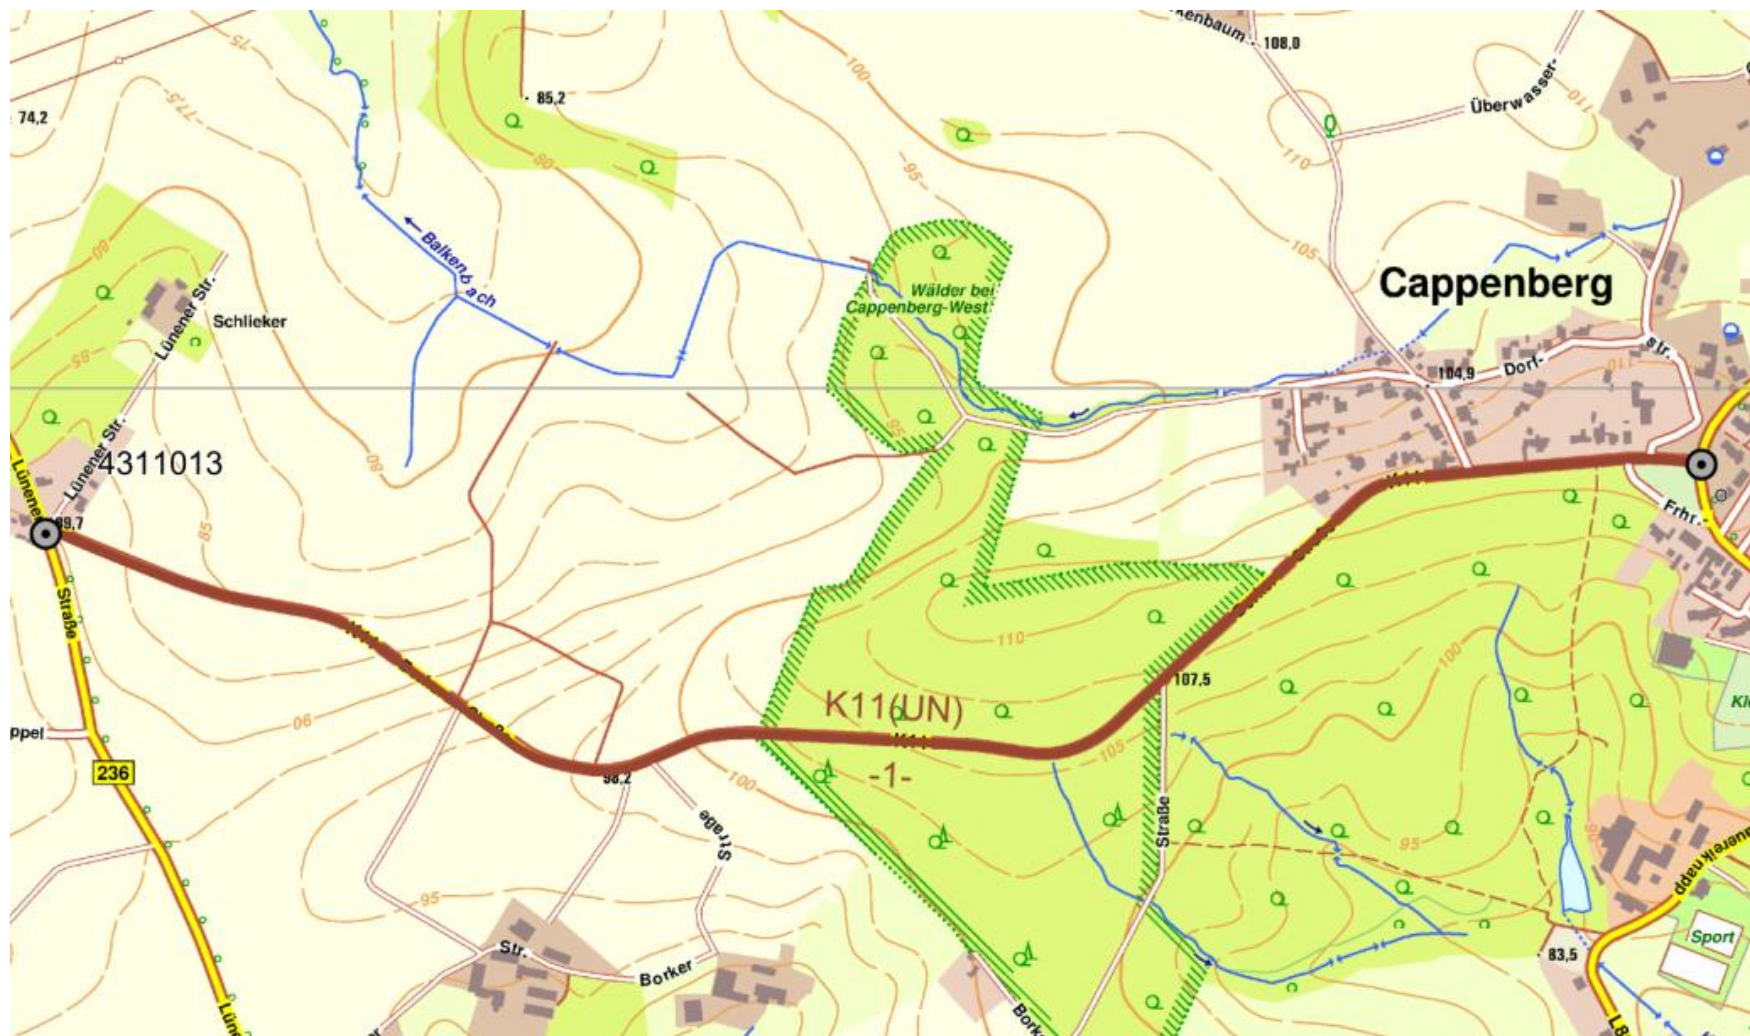

K11, Borker Straße, Selm-Cappenberg

- Erneuerung der Asphaltdeck- und Tragschicht
- Sanierung beginnt nach den Leitungsarbeiten (Gelsenwasser)
- Bauende Sommer 2023


K21, Reichshofstraße, Schwerte

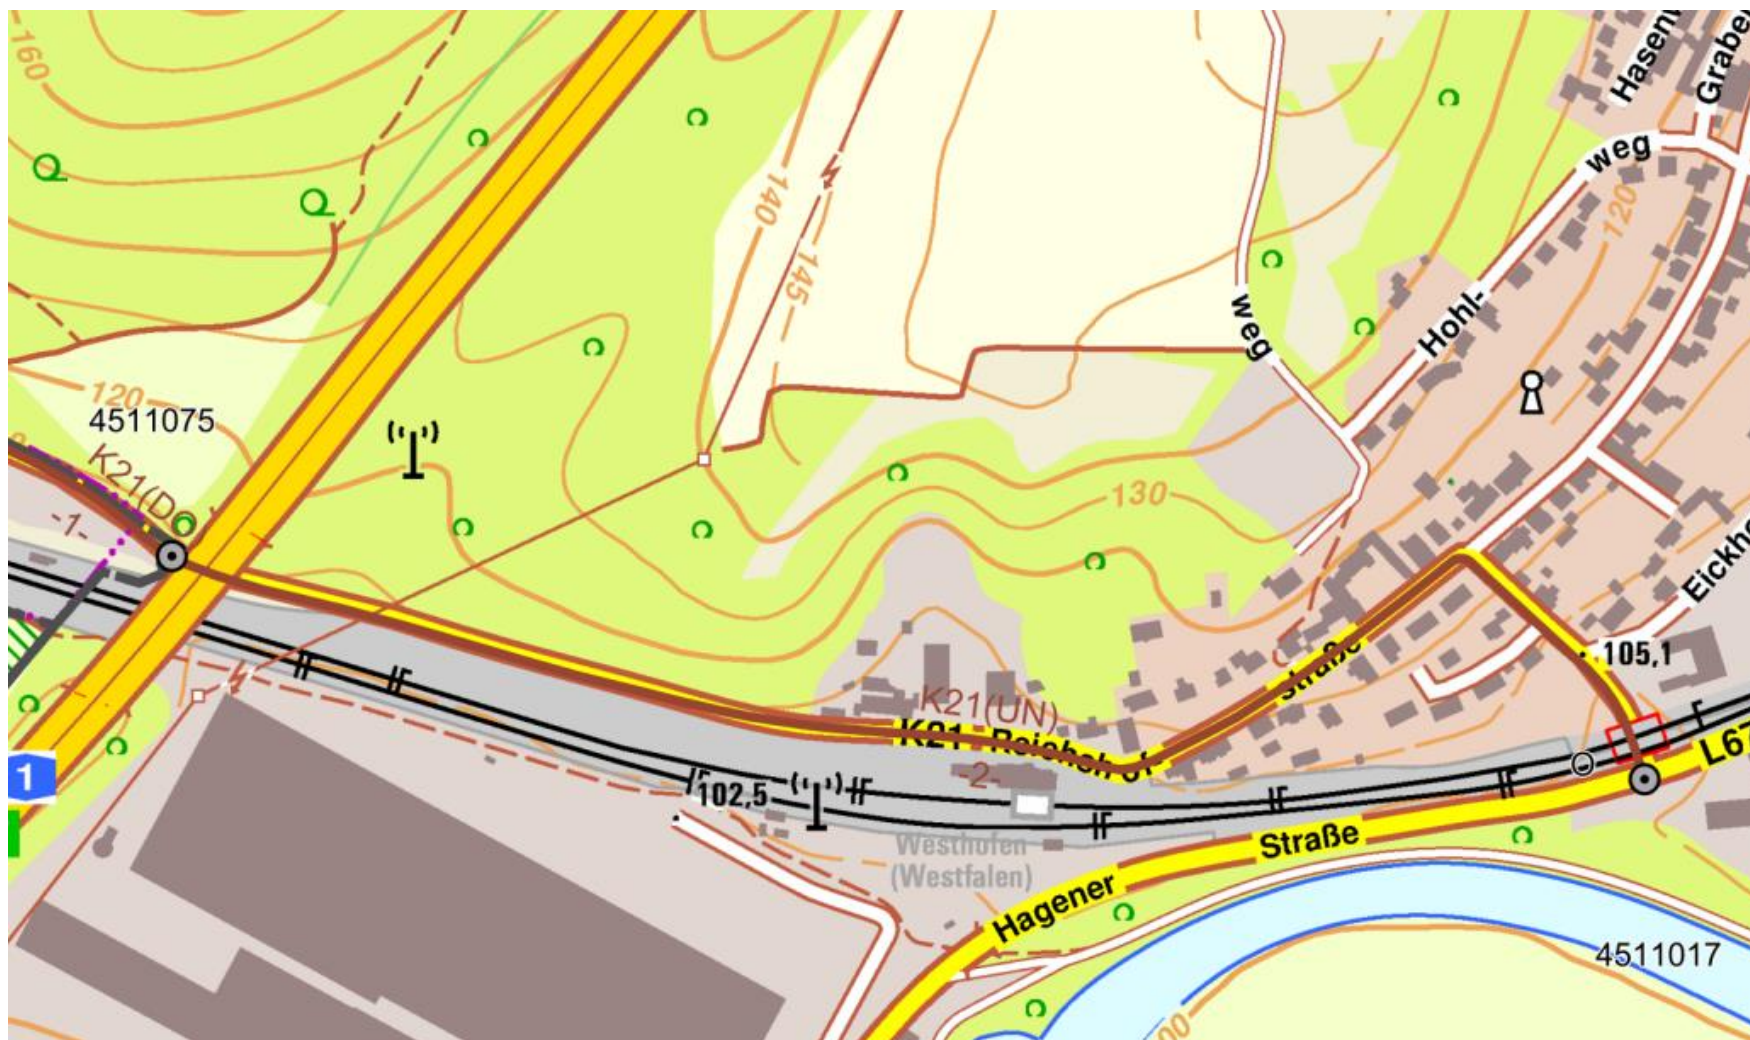

K21, Reichshofstraße, Schwerte

- Erneuerung der Asphaltdeck- und Tragschicht
- Baubeginn Ende November bis Ende März 2023 in Abhängigkeit der Witterung
- verspätete Vergabe aufgrund von Verzögerungen anderer Maßnahmen
- Rückmeldung zur Radwegführung steht noch aus


K31, Landweg, Holzwickede

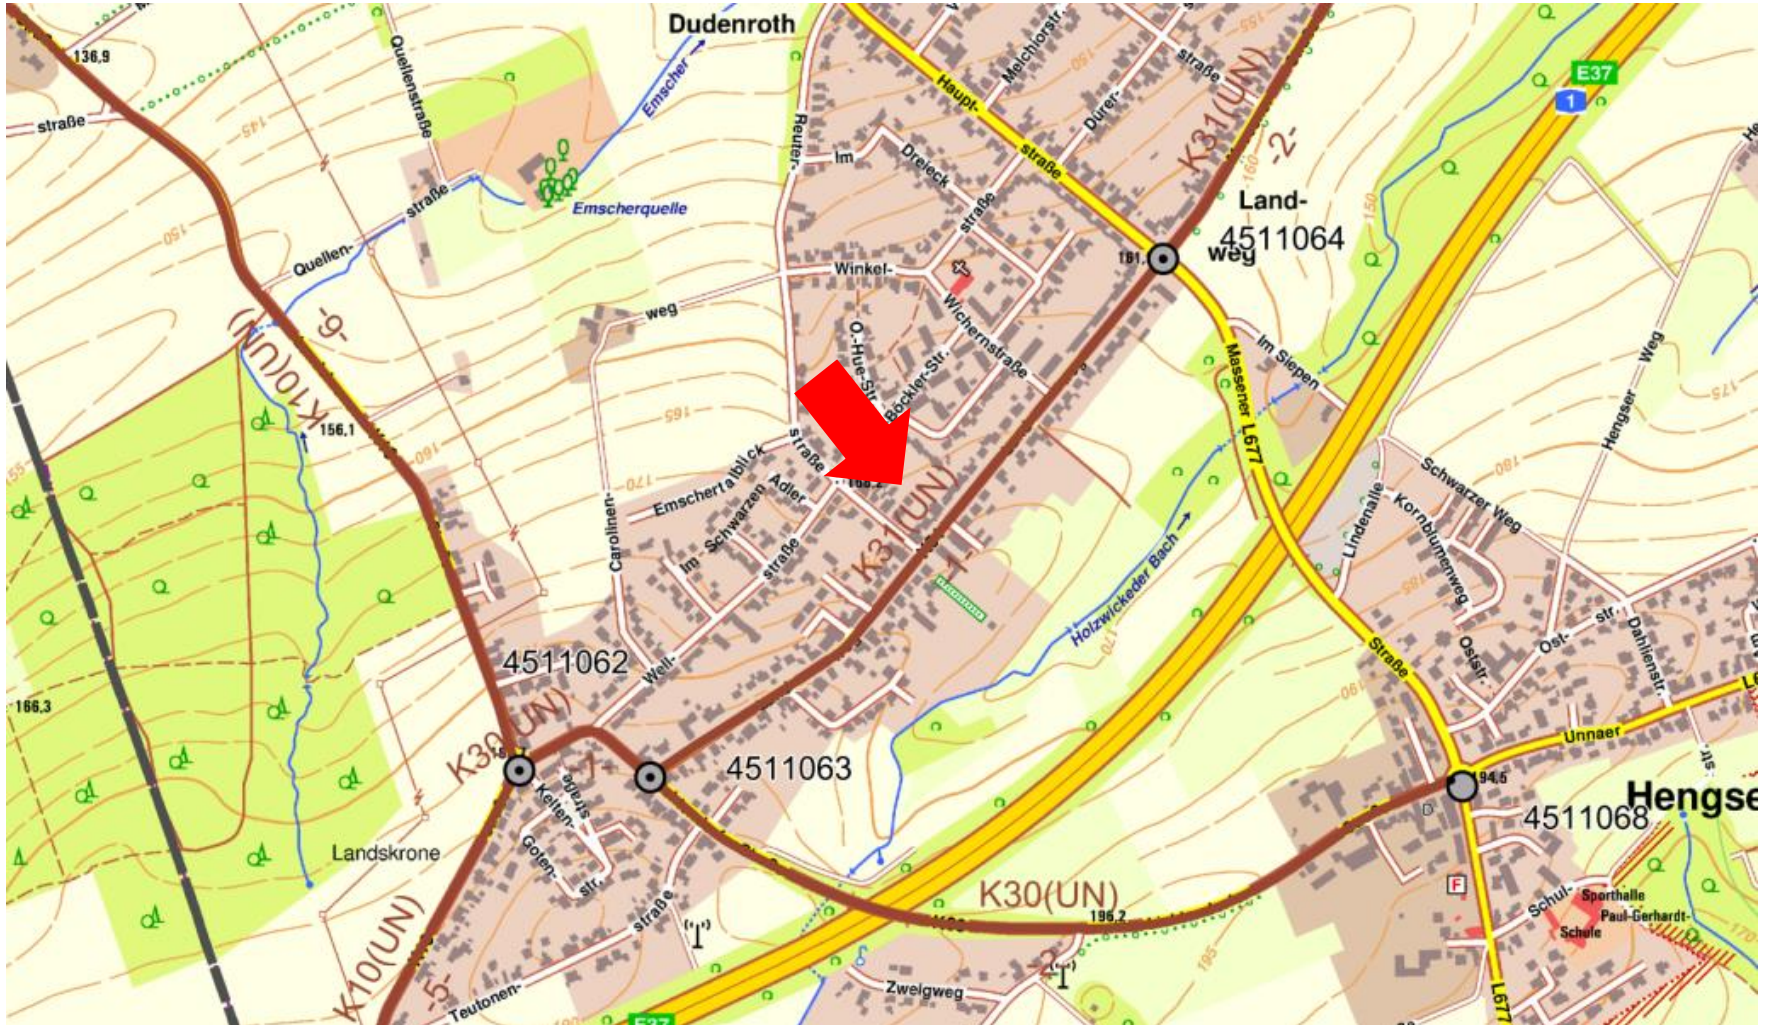

K31, Landweg, Holzwickede

- Erneuerung der Asphaltdeck- und Tragschicht
- Ummarkierung der Strecke in einen einseitig geführten Schutzstreifen (Radverkehrskonzept)
- Baumaßnahme ist vergeben
- Baubeginn März 2023
- ca. 3 Wochen Bauzeit

K19, Alstedder Straße, Radwegsanierung, Selm

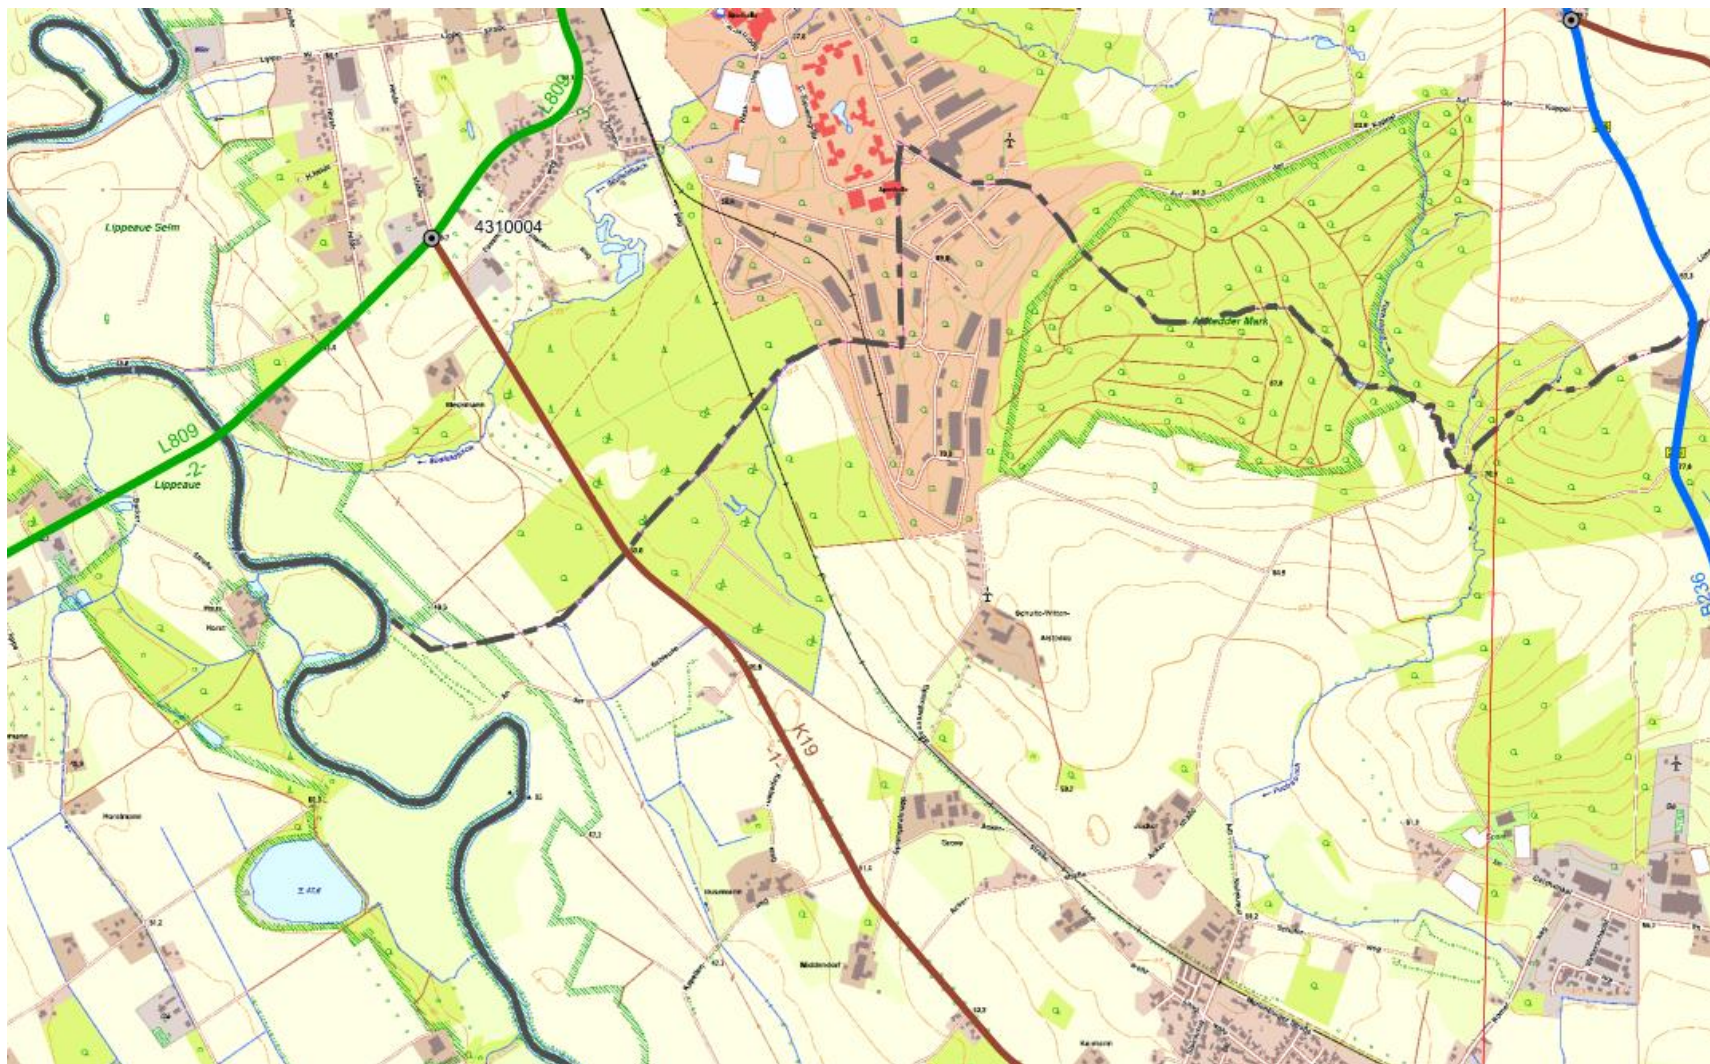

K19, Alstedder Straße, Radwegsanierung, Selm

- Radwegsanierung und Verbreiterung von 2,00m auf 2,5m sowie Absenkung einer Gradiente und Bau einer Winkelstützmauer
- Auftrag vergeben
- Bau November 2022 bis Ende des Jahres


K8, Netteberger Straße, Radwegsanierung, Selm



K8, Netteberger Straße, Radwegsanierung, Selm

- Radwegsanierung und Verbreiterung von 2,00m auf 2,5m
- Auftrag vergeben
- Bau nach Fertigstellung K31 Landweg in 2023 (ursprünglich Ende 2022)
- Bauzeit 2 Monate

K42, Rhynerner Straße, Bönen

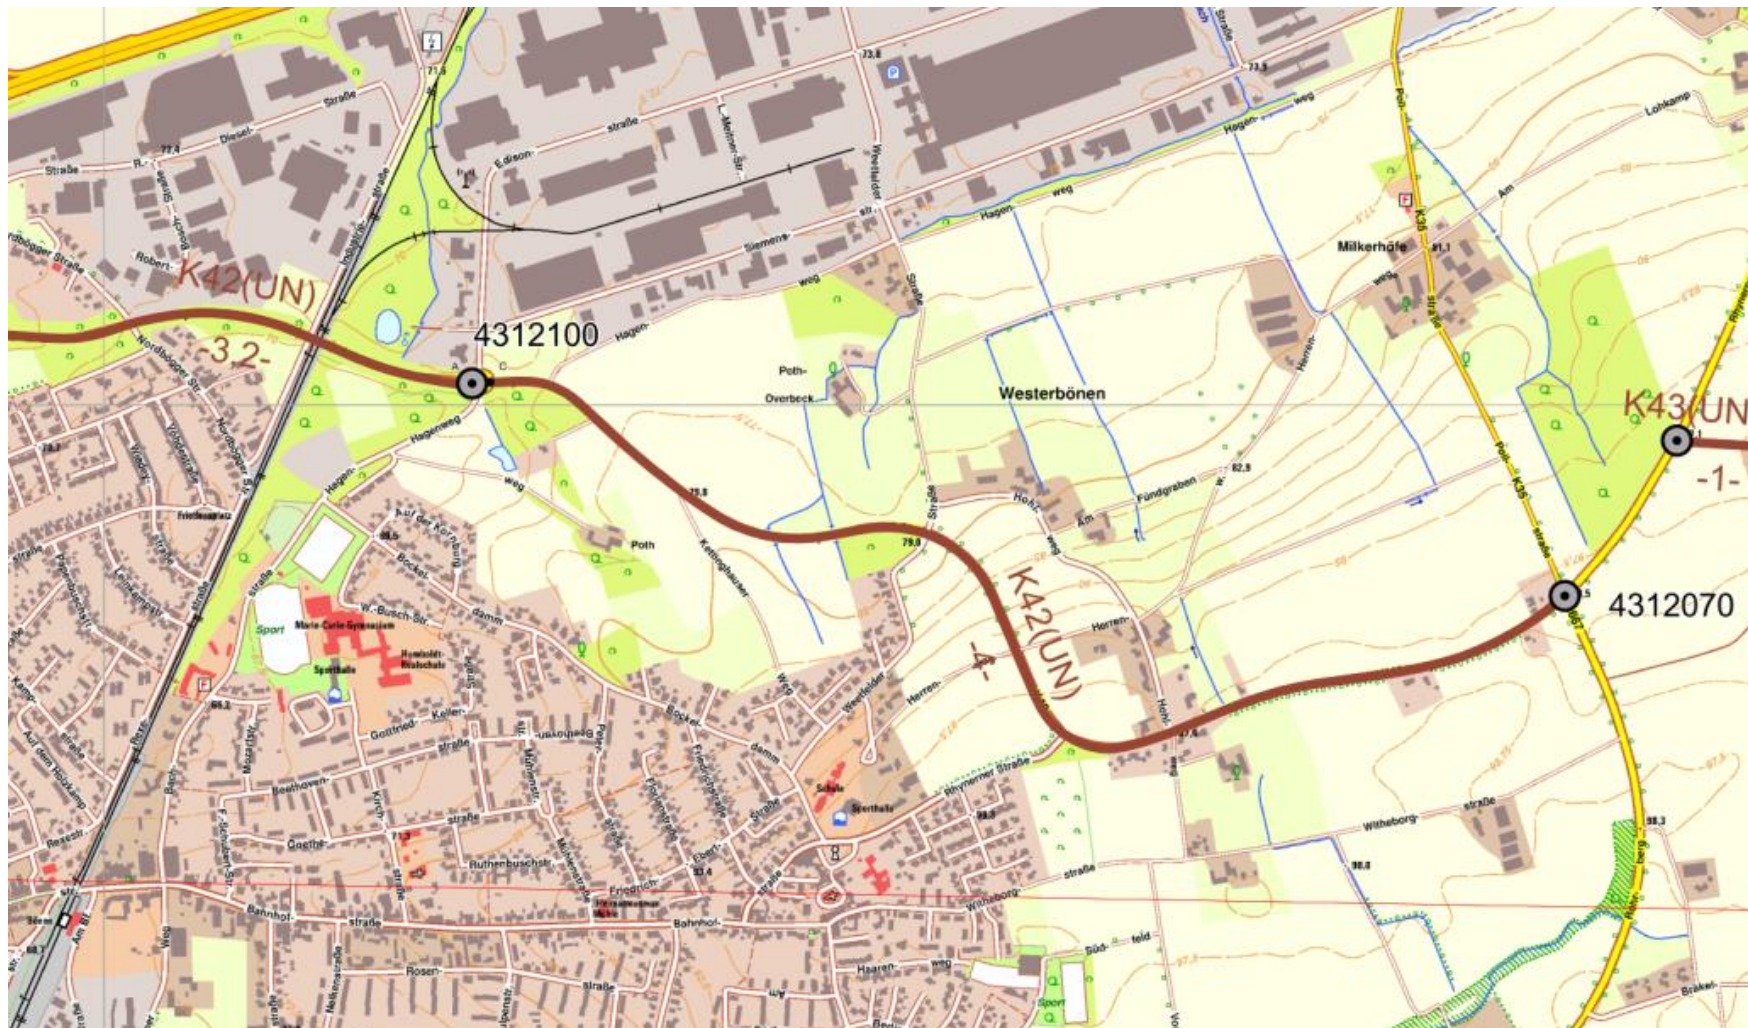

K42, Rhynerner Straße, Bönen

- Radwegverbreiterung von 2,00m auf 2,5m
- Bauzeit November bis Ende 2022
- Förderung durch sogenannte „Billigkeitsrichtlinie“ in Höhe von 180.000€
- Baubeginn erfolgt
- Fertigstellung Ende des Jahres

K2, Brücke über die Lippe

- Kreis Recklinghausen hat den Auftrag für die Ausführungsplanung ausgeschrieben
- Vergabe der Bauleistung im Herbst 2023
- Vereinbarung zur Durchführung mit dem Kreis Coesfeld und Kreis Recklinghausen wird erstellt
- Planfeststellungsbeschluss seit März 2022
